

ДОСЬЕ РЕШЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОМУ ОБЪЕКТУ

Проверьте объект **до того**, как расхождение стало договором, платежом или потерей срока.

Корпоративный контур финансово-технической проверки для
девелопера и заказчика строительства.

Универсальная версия

Без идентификации закрытых объектов и
неподтверждённых эффектов.

Формат входа

Диагностика → доказательный пилот → внедрение.

РЕШЕНИЕ РУКОВОДСТВА

СтройИнтеллект создаёт второй доказательный контур решения по объекту.

Проблема

Документы и функции дают несовпадающие версии предмета, стоимости и срока.

**Механизм**

Сопоставление физики, цены, договора, финансирования и происхождения данных.

**Результат**

Защищаемая позиция: факт, риск, сумма, срок, условие и действие.

**Безопасный вход**

Проверка на конкретном объекте с ручным эталоном и ответственными специалистами.

01

Один объект вместо абстрактной демонстрации

02

Контрольный расчёт вместо доверия к интерфейсу

03

Решение человека вместо автономного вердикта

ПЯТЬ ТОЧЕК НЕОБРАТИМОСТИ

Пять решений определяют деньги объекта раньше, чем появляется финансовый результат.

Договор

Что включено, исключено и кто несёт риск изменения.

Подрядчик

Сопоставима ли цена и обеспечен ли реальный состав работ.

Бюджет

На каком основании утверждается лимит и резерв.

Финансирование

Как график работ влияет на кредит и кассовый разрыв.

Срок

Какие поставки и условия меняют дату ввода.

Цена ошибки возникает в момент решения. В отчётности она появляется позже, когда изменение уже закреплено обязательствами.

НЕСОВПАДАЮЩИЕ ВЕРСИИ

Один объект часто существует сразу в нескольких несовпадающих версиях.

Каждый документ описывает объект через собственную логику: проектную, сметную, коммерческую, договорную или финансовую.

Риск не в наличии версий.

Риск в том, что решение принимается до доказанного сопоставления предмета.

Проект

Физика, параметры, комплектность

Ведомость объёмов

Позиции, единицы, количество

Смета

Расценки, коэффициенты, индексы

Предложение и договор

Исключения, условия, ответственность

Финансовая модель

Маржа, кредит, денежный поток, срок

МЕЖФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РАЗРЫВЫ

Самый дорогой риск возникает между документами и функциями.

Проект ↔ смета

Объём, решение, раздел и единица не сопоставлены.

Смета ↔ закупка

Материал, оборудование и логистика живут в разных составах.

Закупка ↔ договор

Цена сравнивается без условий оплаты, удержаний и гарантий.

**График ↔
финансирование**

Поставка и кредитная выборка не связаны с критическими датами.

**Все контуры ↔
решение**

Ответственный получает сумму без доказательного маршрута.

Высота красного поля показывает не измеренный ущерб, а относительную критичность точки проверки.

ЗАЩИЩАЕМАЯ ПОЗИЦИЯ

Руководству нужен не ещё один отчёт, а позиция, которую можно **защитить**.

Факт	Риск	Сумма	Срок	Условие	Действие
Что подтверждено документом или контрольным расчётом.	Какие расхождения меняет решение.	Финансовое влияние с формулой и статусом.	Критическая дата, поставка или зависимость.	При каком допущении вывод остаётся действительным.	Кто, что и к какому сроку должен подтвердить.

ЦЕНА ТЕКУЩЕГО ПРОЦЕССА

Итоговая сумма создаёт ложную определённость, если предмет работ не сопоставлен.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ А

РР**Минимальная сумма**

Не включены пусконаладка, временные сети и часть оборудования.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В

РРРР**Средняя сумма**

Полный монтаж, но иные условия аванса и гарантийного удержания.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ С

РРРРРР**Максимальная сумма**

Включены оборудование, логистика и дополнительные обязательства.

Сравнение суммы без нормализации состава отвечает на неправильный вопрос.

СОСТАВ ВАЖНЕЕ ЯРЛЫКА ЦЕНЫ

Низкая цена подрядчика может быть ценой
исключённого состава.

Предмет сравнения	Подрядчик А	Подрядчик В	Подрядчик С	Решение
Основные работы	Включено	Включено	Включено	Сопоставимо
Оборудование	Отсутствует	Частично	Включено	Нормализовать
ПНР	Отдельно	Включено	Неясно	Запросить
Логистика	Исключена	Лимит	Включено	Пересчитать
Гарантия	12 мес.	24 мес.	По изготовителю	Учесть условие

Иллюстративная структура сравнения, без переноса данных закрытого объекта.

ЦЕПОЧКА ВЛИЯНИЯ

Техническая дельта проходит через себестоимость, кредит, маржу и дату ввода.



Система не подменяет финансовую модель. Она показывает, какое техническое основание должно изменить её входные параметры.

ВЕРСИОННОСТЬ

Ручной перенос создаёт новые версии истины.

Проектный файл

Исходная версия, лист, дата и комплект.

Excel эксперта

Ручная выборка, новые названия, скрытые допущения.

Почта и мессенджер

Комментарий отделён от строки и формулы.

Сметное ПО

Иная структура и собственная версия состава.

Договор и финмодель

Решение получает новую сумму без полного следа происхождения.


Потеря происходит не только в цифре.

Исчезают причина изменения, автор, дата, статус и условие применимости.

КОРПОРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Проверка, зависящая от одного эксперта, не становится корпоративным стандартом.

Эксперт может удерживать в голове историю объекта. Организация теряет её при смене роли, подрядчика или версии документа.



1

узкое место

Если метод нельзя воспроизвести, проверить и передать, он остаётся личной практикой.

НЕ ЕЩЁ ОДНА УЧЁТНАЯ СИСТЕМА

Учётные системы фиксируют введённое, но не оспаривают основание решения.

УЧЁТНЫЙ КОНТУР**Что произошло**


- проведён документ;
- зафиксирован лимит;
- создан договор;
- отражён платёж;
- обновлён график.

**ДОКАЗАТЕЛЬНЫЙ КОНТУР****Почему это основание допустимо**

- сопоставлен предмет;
- проверены источники;
- объяснено отклонение;
- зафиксированы неизвестные;
- назначено действие.


ПРОЦЕСС ДО

До СтройИнтеллекта решение собирается после множества разрозненных проверок.

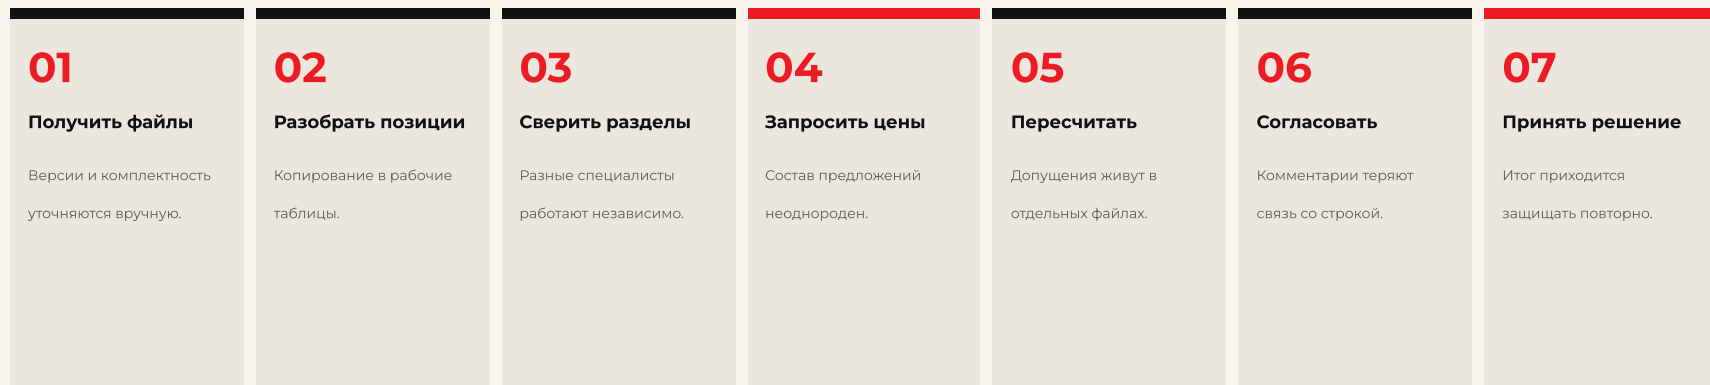

ПРОЦЕСС ПОСЛЕ

После внедрения объект получает единое досье решения.

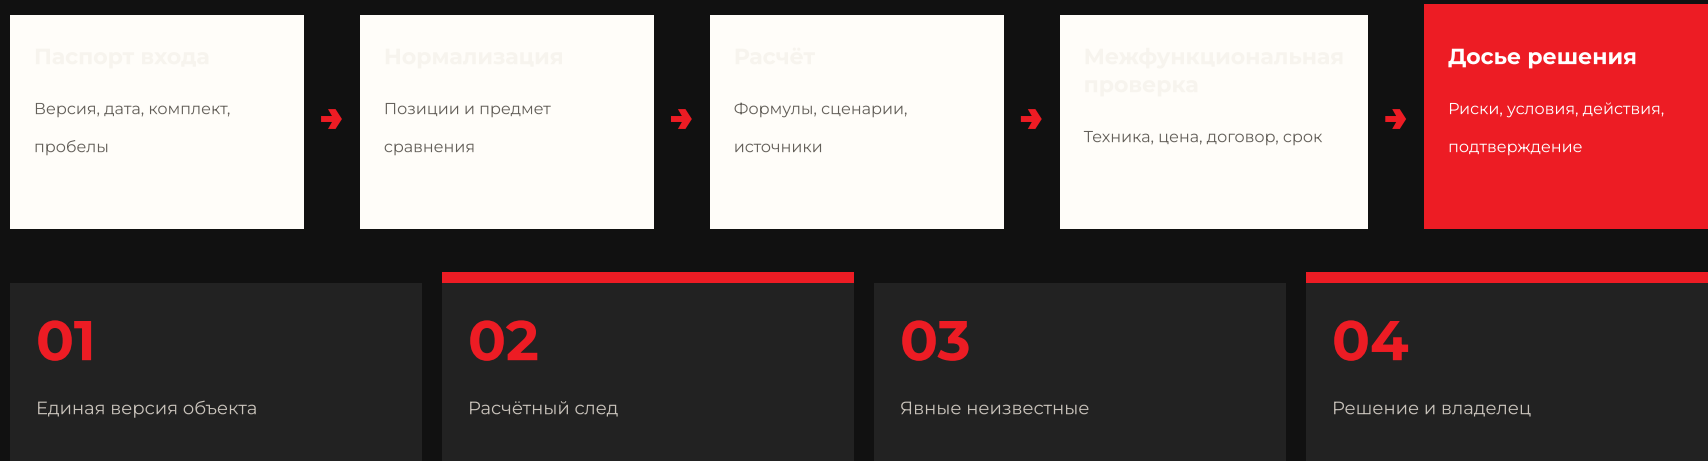

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

Собственная оценка формируется независимо от предложений подрядчиков.

ИСТОЧНИК 01

Опорная база

Расценки, материалы, оборудование, нормативы, финансирование и фактические сверки.

ИСТОЧНИК 02

История заказчика

Закрытые объекты, договоры, фактическая себестоимость и подтверждённые условия.

ИСТОЧНИК 03

Документы объекта

Проект, смета, предложения, график, договорные и финансовые параметры.

Расчётный модуль

Арифметика и сценарии

+

Аналитический контур

Классификация причин

=

Объяснимая оценка

Диапазон, источник, причина и статус

СОПОСТАВИМЫЙ ПРЕДМЕТ

Предложения сравниваются по одинаковому предмету работ.

Нормализованная позиция	Предложение А	Предложение В	Предложение С
Насосный агрегат	Комплект, без ПНР	Оборудование + ПНР	Отсутствует
Трубопровод	м.п., материал включён	м.п., материал отдельно	узел, требуется перевод
Автоматика	Неясный состав	Шкаф + монтаж	Монтаж без шкафа
Гарантия	12 месяцев	24 месяца	По изготовителю
Условия оплаты	Аванс высокий	Удержание	Оплата по этапам

Система показывает, где автоматическое сопоставление допустимо, а где требуется подтверждение пользователя.

РЕЕСТР ОТКЛОНЕНИЙ

Каждое отклонение переводится в сумму, основание и путь урегулирования.

Позиция	Статус	Влияние	Основание	Действие
Комплектация инженерного узла	Расхождение	Расчёт	Раздел проекта + КП	Запросить уточнение
Объём по ведомости	Оценка	Диапазон	Лист и формула	Подтвердить ГИП
Длительная поставка	Критично	Срок	График + источник цены	Изменить дату заказа
Удержание по договору	Подтверждено	БДДС	Пункт договора	Пересчитать сценарий

Правило: формулировка «требуется уточнить» допустима только с указанием ответственного и срока.

ЭКОНОМИКА ОБЪЕКТА

Экономика объекта пересчитывается в трёх сценариях.

А

Базовый

- подтверждённый состав;
- текущие условия финансирования;
- исходный график работ;
- зафиксированный резерв.

В

Риск реализован

- изменение объёма;
- сдвиг поставки;
- дополнительная выборка кредита;
- кассовый разрыв.

С

Условие урегулировано

- нормализованная цена;
- изменённые условия оплаты;
- перенос закупки;
- обновлённая маржа.

Расчёт охватывает себестоимость, маржу, график выборки кредита, БДДС и прогноз возможного кассового разрыва.

ЦЕНА И УСЛОВИЯ

Договорные условия рассматриваются вместе с ценой и сроком.

Аванс

Меняет график денег и риск обеспечения.

Удержание

Создаёт отсроченный денежный поток.

Твёрдая цена

Переносит риск изменения состава и рынка.

Приёмка

Определяет момент признания работ и платежа.

Гарантия

Влияет на резерв и ответственность.

Штрафы

Связывают технический срок с финансовым риском.

Цена предложения

Номинальная сумма

**Условия договора**

Распределение риска

**График**

Время денег

**Полная позиция**

Допустимый сценарий сделки

ЦЕННОСТЬ ПО РОЛЯМ

Каждая роль получает собственный рабочий результат, но руководство видит единую картину.

Собственник / ГД

Условия решения, риск капитала, ответственные действия.

Финансовый директор

Сценарии маржи, кредит, БДДС, кассовый разрыв.

Директор по строительству

Технические дельты, комплектность, сроки поставки.

Сметный блок

Расценки, объёмы, коэффициенты и реестр отклонений.

Закупки

Сопоставимый предмет, ориентиры и критические даты заказа.

Юристы

Распределение рисков, гарантии, приёмка и урегулирование.

ИТ / ИБ

Контуры обработки, журнал, роли и источники данных.


Технический заказчик

Единое досье объекта и воспроизводимая методика проверки.

Единицей ценности становится не ответ агента, а согласованная позиция покупательского комитета.

СКВОЗНОЙ ПРОЦЕСС

Путь от файла до решения проходит через управляемые точки подтверждения.

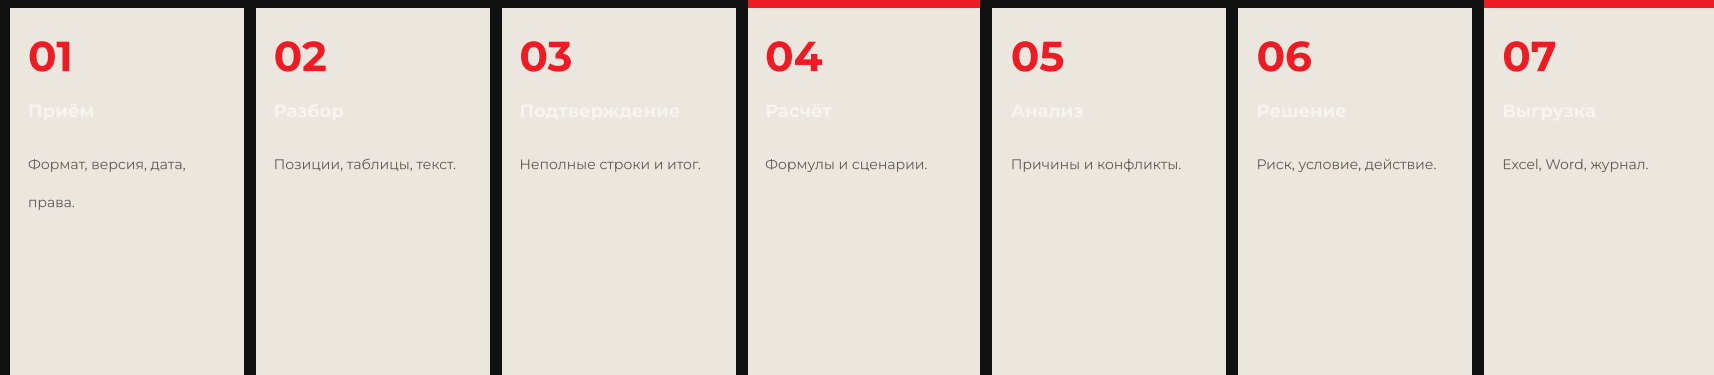

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ

Система работает с конкретным перечнем поддерживаемых форматов.

XLS

Excel .xlsx/xls: извлечение позиций и определение структуры таблицы.

XML

Структурированный формат ГРАНД-Сметы.

DOC

Word .docx: таблицы и текст договоров.

PDF

PDF с текстовым слоем: передача текста в аналитический контур.

CSV

Согласованные структурированные файлы через выделенный каталог.

Граница: оптическое распознавание сканов и формат АРПС не входят в референсный объём.

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДО РАСЧЁТА

Извлечённые позиции подтверждаются до запуска расчёта.

№	Позиция	Ед.	Объём
01	Работа подтверждена	м²	1 240
02	Неполное наименование	—	85
03	Оборудование	компл.	ручная правка
04	Монтаж	шт.	24

Контроль 1

Неполные строки помечаются и допускают ручную правку.

Контроль 2

Сумма извлечённых позиций сверяется с итогом источника.

Контроль 3

Сопоставление нескольких предложений можно подтвердить или исправить.

РАЗДЕЛЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Расчётный модуль отвечает за арифметику, модели — за анализ и объяснение.

Расчётный модуль

- сходимость сумм;
- себестоимость по элементам;
- проценты по кредиту;
- график выборки;
- БДДС и сценарии.



Аналитический контур

- классифицирует отклонения;
- объясняет причины;
- связывает контуры;
- формирует вопросы;
- готовит рекомендацию.

Числовой результат не должен зависеть от свободной генерации текста.

ПРИЧИНА ОТКЛОНЕНИЯ

Расчётно-аналитическая оценка объясняет не только величину, но и причину отклонения.

01

Рынок

Изменение ценового уровня или доступности ресурса.

02

Техническое решение

Иная комплектация, характеристика или технология.

03

Объём

Расхождение ведомости, проекта и предложения.

04

Расценка

Завышение единичной стоимости или коэффициента.

05

Двойной учёт

Одна работа или ресурс включены более одного раза.

Аномалия сопровождается суммой влияния, исходными значениями, статусом и объяснением.

КОРПОРАТИВНОЕ ЗНАНИЕ

Опорная база хранит четырнадцать типов корпоративного знания.

01. Расценки на работы	02. Материалы	03. Длительные поставки	04. Себестоимость Р/м ²	05. Финансирование	06. Ставки труда	07. Нормативы выработки
08. Алгоритмы	09. Нормативная база	10. Реестр объектов	11. Уроки прошлых расчётов	12. План / факт	13. Подрядчики из документов	14. Сопоставление предложений

База загружается администратором по установленной структуре и используется расчётным и аналитическим контурами.

ПРАВИЛО ДОВЕРИЯ

Значение без источника, даты и статуса не становится основанием решения.

Значение	Единица	Год	Источник	Статус	Дата проверки
Число или диапазон	Сопоставимая мера	Период применимости	Документ или объект	Факт / аргентир / нет данных	Контроль актуальности

90

дней

После этого значения помечаются как требующие проверки.

Признак устаревания выводится в каждом расчёте, где использовано такое значение. Система не скрывает неопределённость под точным числом.

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЙ ПРОЦЕСС

Девять компетенций работают как один процесс проверки объекта.

Инженерный контур

Параметры, объёмы, комплектность.

Сметный

Расценки, коэффициенты, отклонения.

Закупочный

Цены, сроки поставки, ориентиры.

Подрядный

Сопоставление предложений и диапазон.

Финансовый

Себестоимость, маржа, кредит, БДДС.

ПТО

Финансовое влияние производственных расхождений.

Договорный

Риски условий и пути урегулирования.

Управленческий

Сводный вывод, меры, деньги и сроки.


Административный

Протокол, задачи, ответственные и даты.

Клиентская ценность определяется качеством единого результата, а не количеством компонентов.

РАБОЧИЕ ПОВЕРХНОСТИ

Шесть рабочих экранов поддерживают путь пользователя от объекта до выгрузки.

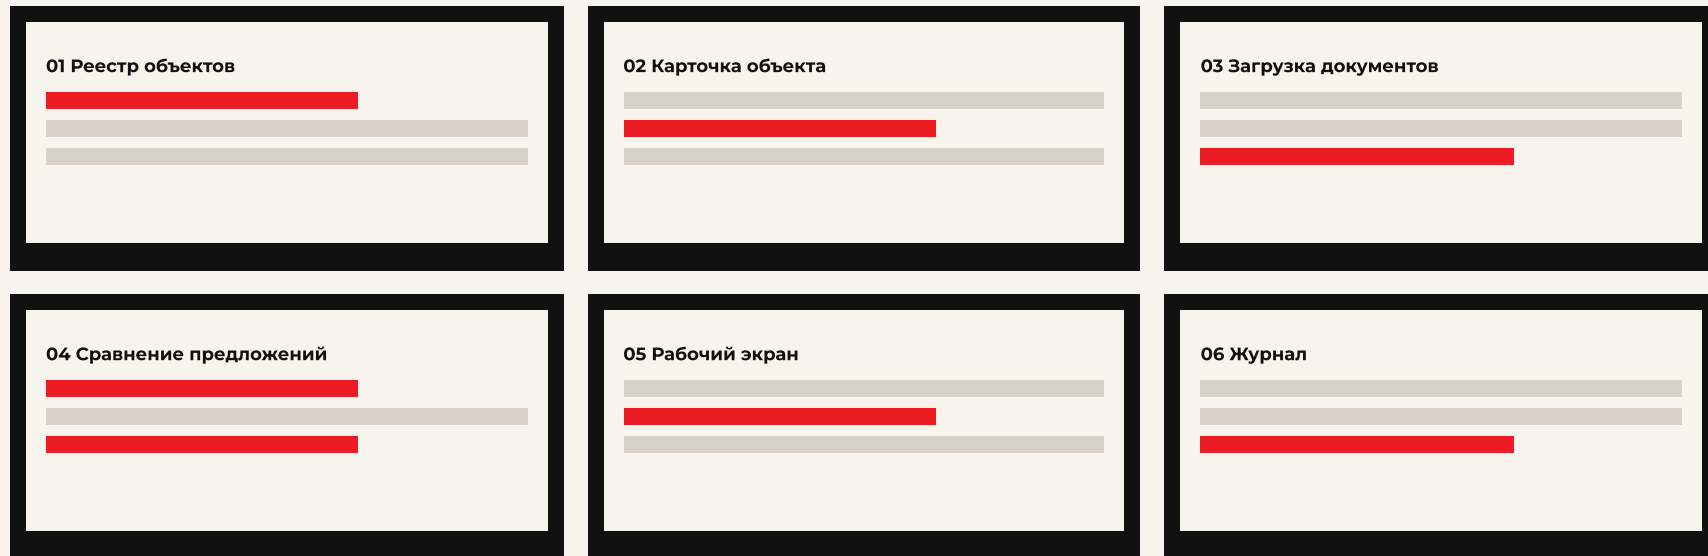

Концептуальная схема экранов. Финальная конфигурация уточняется в проекте внедрения.

АСИНХРОННАЯ РАБОТА

Длительные проверки выполняются в очереди и не блокируют работу пользователя.

Очередь задач

Объект 01	Сопоставление предложений	в работе
Объект 02	Финансовый сценарий	нужны данные
Объект 03	Реестр отклонений	готово
Объект 04	Повторный запуск	в очереди

Экспресс

Короткий сводный вывод.

Стандарт

Полный рабочий расчёт.

Эксперт

Углублённый межфункциональный разбор.

Пользователь видит статус, причину остановки, результат и возможность повторного запуска.

ДАННЫЕ И ИНТЕГРАЦИИ

Система имеет собственную базу данных и несколько согласуемых каналов получения данных.

API

Программный интерфейс при наличии доступного интерфейса со стороны корпоративной системы заказчика.

FILE

Структурированные файлы согласованного формата в выделенном каталоге с журналом отклонённых записей.

CORE

Собственная база объектов, документов, извлечённых позиций, проверок и исторических данных.

Отдельно оцениваются: специализированные коннекторы, обратная запись и встраивание интерфейсов в иные системы.

ЦЕПОЧКА ПРОИСХОЖДЕНИЯ

Любая существенная цифра должна возвращаться к строке документа и формуле.

Источник Файл, версия, дата, право	Строка Лист, позиция, фрагмент текста	Нормализация Единица, состав, сопоставление	Формула Входы, операция, сценарий	Статус Подтверждено / оценка / нет данных	Решение Риск, условие, действие, ответственный.
--	---	---	---	---	---

Прослеживаемость важнее убедительности текста: любой вывод должен выдерживать возврат к основанию.

ЧЕСТНАЯ НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ

Неизвестное не маскируется точным числом.



Подтверждено

- есть источник;
- дата актуальна;
- формула проверяема;
- условие применимости известно.



Оценка

- указан диапазон;
- видны допущения;
- обозначена точность;
- назначена проверка.



Нет данных

- не подставляется среднее;
- видно влияние пробела;
- указан владелец;
- задан срок уточнения.

МЕЖКОНТУРНЫЕ КОНФЛИКТЫ

Расхождения между функциональными контурами
показываются пользователю явно.

Вопрос	Инженер	Смета	Договор	Финансы
Объём	Подтверждён	Иное значение	Не указан	Исходный
Оборудование	Нужно	Частично	Исключено	Не учтено
Срок поставки	Критический	Нет данных	Ответственность заказчика	Сдвиг выборки
Решение	Требует подтверждения	Пересчитать	Изменить условие	Обновить сценарий

Конфликт не усредняется. Он становится отдельным объектом подтверждения.

ЭТАЛОННАЯ МЕТОДИКА

Эталонные объекты превращают методику клиента в проверяемый стандарт.

01**Закрытый объект**

Позволяет восстановить решение по известному факту и найти точки расхождения.

02**Ручной расчёт**

Создаёт контрольную базу специалистов заказчика для сравнения результата.

03**Чек-лист качества**

Фиксирует обязательные элементы результата каждой функциональной компетенции.

Приёмка проводится на согласованном контрольном наборе, не менее чем по двум объектам.

ИЗМЕРИМАЯ ПРИЁМКА

Качество фиксируется критериями, а не впечатлением от демонстрации.

≥95% Корректное извлечение Доля позиций контрольного набора. цель приёмки	0 ₽ Сходимость итога Расхождение суммы разделов с источником. цель приёмки	≥70% Полнота нарушений Относительно ручного расчета заказчика. цель приёмки	≥80% Чек-лист компетенций По каждой из девяти функциональных зон. цель приёмки	15м / 1ч / 5ч Режимы ответа При согласованной конфигурации оборудования. цель приёмки
--	--	---	--	--

Пороговые значения калибруются и фиксируются протоколом до приёмки. Это не заявление о достигнутых результатах.

КОММЕРЧЕСКАЯ ТАЙНА

Коммерческая тайна по умолчанию обрабатывается во внутреннем контуре.

Внутренний контур

- документы и опорная база;
- исторические данные;
- извлечённые позиции;
- расчёты и результаты;
- локальные модели.



Регулируемый внешний контур

- только процессы из регламента;
- анонимизация до запуска;
- минимально необходимые данные;
- признак происхождения;
- журнал передачи.

До утверждения регламента внешняя передача блокируется. Исходные сведения коммерческой тайны за пределы контура не передаются.

ГРАНИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Система готовит позицию, но решение и ответственность остаются у специалистов.

Система

- собирает основания;
- считает сценарии;
- показывает расхождения;
- фиксирует неизвестное;
- готовит рекомендацию.



Ответственный специалист

- проверяет контекст;
- подтверждает критические выводы;
- принимает профессиональное решение;
- подписывает документы;
- несёт установленную ответственность.

Решение не заменяет проектную экспертизу, юриста, главного бухгалтера или управленческие полномочия заказчика.

ОТДЕЛЬНЫЙ КЛАСС РЕШЕНИЯ

СтройИнтеллект не дублирует Excel, сметное ПО, ERP или информационную модель.

Задача	Excel	Сметное ПО	ERP / учёт	СтройИнтеллект
Хранить расчёт	Да	Да	Частично	Да
Составить смету	Вручную	Да	Нет	Не заменяет
Зафиксировать операцию	Частично	Нет	Да	Не заменяет
Сопоставить предмет	Вручную	Ограниченно	Нет	Основная функция
Связать технику, цену, договор и финансы	Вручную	Нет	После ввода	Основная функция
Показать источник и неизвестное	По дисциплине	Частично	История операций	Встроенное правило

МЕСТО В ЛАНДШАФТЕ

Он добавляет интеллектуальный слой проверки поверх существующих источников.

СтройИнтеллект: сопоставление, происхождение, конфликты, сценарии, досье решения

Расчётный и интеграционный слой: база данных, формулы, каналы получения данных


Корпоративные системы: учёт, документооборот, планирование, информационные модели

Источники: проект, ведомости, сметы, предложения, договоры, графики

Система не требует замены действующего ландшафта. Глубина интеграции определяется отдельно.

БЕЗОПАСНЫЙ ПУТЬ ВХОДА

Безопасный вход проходит от закрытого объекта к пилоту и промышленному контуру.

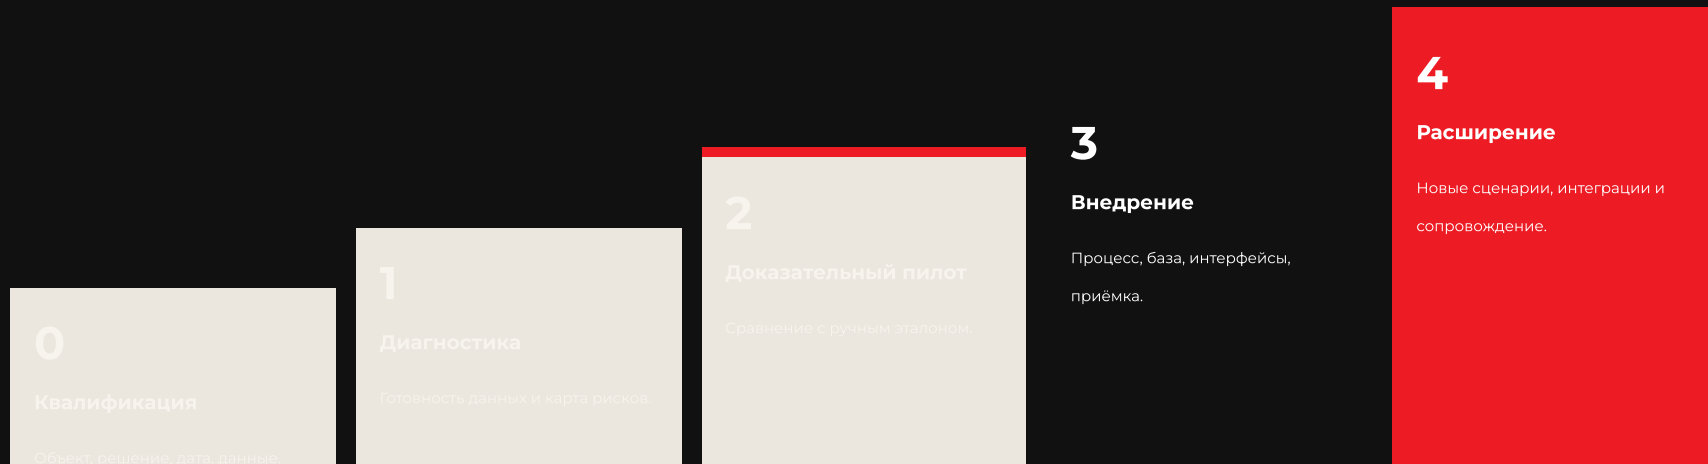

РЕФЕРЕНСНАЯ КОНФИГУРАЦИЯ

Референсная конфигурация внедрения состоит из четырёх измеримых этапов.

45**Развёртывание и опорная база**

Контур, локальные модели, база данных, девять компетенций, режимы, эталоны и регламент.

40**Расчёт и разбор документов**

Формулы, реестр отклонений, себестоимость и финансовые сценарии.

30**Сопоставление и оценка**

Нормализация предложений, аномалии, собственная оценка и диапазон.

20**Интерфейс и приёмка**

Экраны, очередь, журнал, каналы данных, обучение и контрольный набор.

Итого: 135 календарных дней в референсном проекте. Срок конкретного внедрения определяется после диагностики.

КОММЕРЧЕСКАЯ РАМКА

Базовое корпоративное внедрение начинается от 20 млн ₽ с НДС 22%.

от 20 млн ₽

с НДС 22%

Финальная стоимость зависит от сценариев, состава данных, инфраструктуры, требований к безопасности и интеграциям.

Оборудование и нестандартные интеграции рассчитываются отдельно.

Возможный состав

- обследование и проектирование;
- развёртывание в контуре;
- опорная база и расчётный модуль;
- аналитические компетенции;
- рабочие экраны и выгрузки;
- приёмка и обучение;
- референсно: гарантия 12 месяцев;
- право использования фиксируется договором.

Точный объём и юридическая конструкция определяются индивидуальным предложением.

СЛЕДУЮЩИЙ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ШАГ

Выберите объект и решение, которое нельзя принимать вслепую.

На рабочей встрече зафиксируем предмет проверки, контрольный расчёт, владельцев результата и безопасный режим данных.

Для подготовки предложения

- 01** Тип объекта и предстоящее решение
- 02** Комплект документов и версии
- 03** Ручной эталон или контрольный расчёт
- 04** Ответственные специалисты и дата решения
- 05** Требования к контуру и передаче данных

Контакт проектной команды предоставляется в сопроводительном письме.
